41-12-2348-13-019 D-HHU 26.00 BRS Dämmauflagen

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Abstimmungsgespräch mit HHU	1 Tag	Mon 13.09.21	Mon 13.09.21	
2		**Phase 1: Musterflur 26.33.02 - SÜD**				
3		**Flur 26.33.02-SÜD**				
4		!!!Flur 26.33.02-SÜD nicht nutzbar!!!	20 Tage	Mon 17.01.22	Fre 11.02.22	
5		Einrichtung Baustelle	1 Tag	Mon 17.01.22	Mon 17.01.22	
6		Ausbau Decke Bestand	9 Tage	Die 18.01.22	Fre 28.01.22	5
7		Einlegen der neuen Decke inkl. Dämmauflagen/-einlagen	10 Tage	Mon 31.01.22	Fre 11.02.22	6
8		ELT-Arbeiten Decke	2 Tage	Mon 14.02.22	Die 15.02.22	7
9		Demontage FH-Tür (Bestand) und abgehängte Decke (Bestand)	3 Tage	Mon 14.02.22	Mit 16.02.22	7
10		Einbau Abschottung für T30-RS-Tür (neu)	1 Tag	Don 17.02.22	Don 17.02.22	9
11		Einbau T30RS-Tür (neu)	1 Tag	Fre 18.02.22	Fre 18.02.22	10
12		Einbau abgehängte Decke (neu), Demontage RD-Tür (Bestand) und Trockenbau Decke (Bestand)	3 Tage	Mon 21.02.22	Mit 23.02.22	11
13		Einbau Abschottung für RS-Tür (neu)	1 Tag	Don 24.02.22	Don 24.02.22	12
14		Einbau RS-Tür (neu)	1 Tag	Fre 25.02.22	Fre 25.02.22	13
15		Einbau F90-Decke (neu)	3 Tage	Die 01.03.22	Don 03.03.22	14
16		**Phase 2: Austausch Dämmauflagen**				

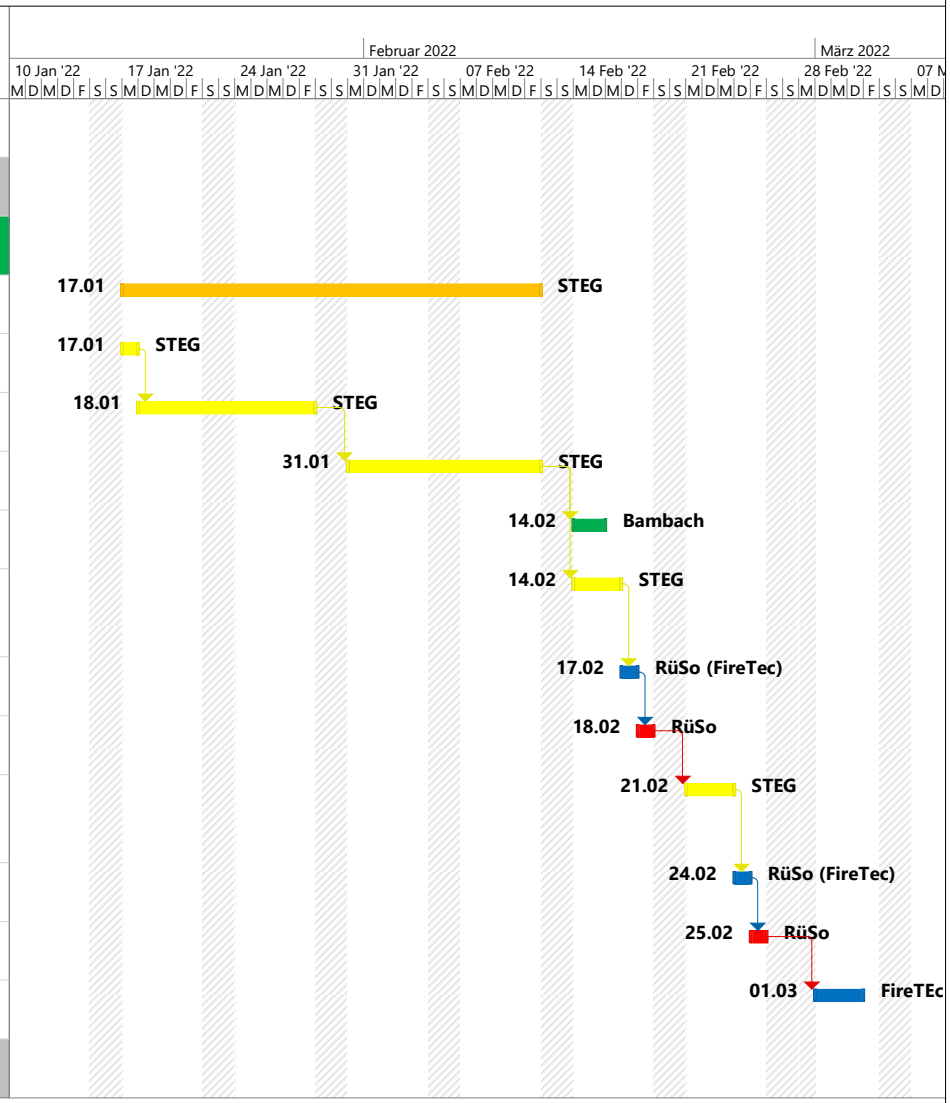

gedruckt am: Die 14.12.21
